


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā¹. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais **statuss 2017. gada decembrī**.

2. **Intensīvi tiek iesniegti investīciju projekti² un slēgti līgumi** – līdz 2017. gada 21. decembrim ir **uzsākti projekti par 2,4 mljrd. euro**, kas ir vairāk kā puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro³.

3. Projektu līgumi ir pamats nepieciešamo investīciju mērķu īstenošanai ar ES fondu atbalstu. Vislielāko progresu uzrāda projekti pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā, inovācijās un vides aizsardzībā, kā arī izglītības jomā. Tāpat ir pieaugoša dinamika maksājumiem par jau veiktām investīcijām projektos. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs⁴.

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. decembrim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. novembrim

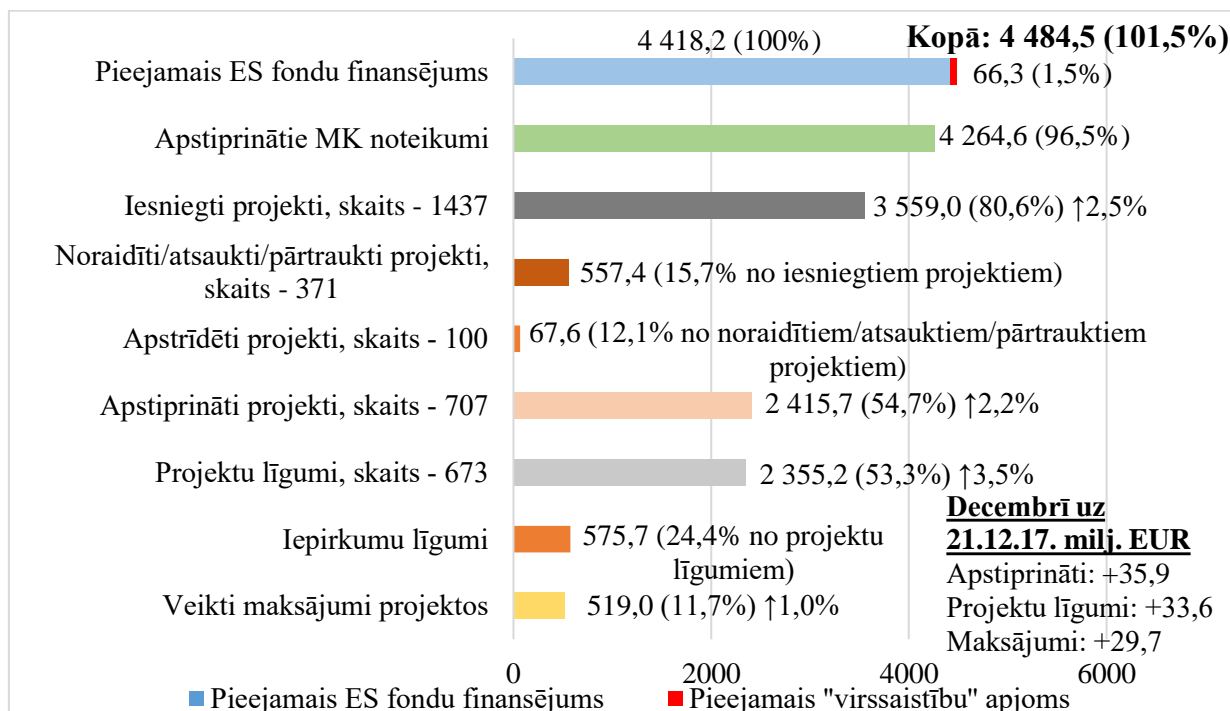

¹ FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.


² Noraidīto/atsaukto/pārtraukto projektu skaits, salīdzinot ar datiem līdz 2017. gada 1. novembrim, palielinājies par 11 projektiem par kopējo plānoto ES atbalsta summu 347,6 milj. euro, kur lielākā daļa, 346,6 milj. euro (t.s. rezerve 28,1 milj. euro) ir pagaidu samazinājums par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kura iesniegšanai noteikts jauns termiņš – 2018. gada 28. februāris.

³ pieaugums 2017. gada novembrī – 3,5% jeb 156 milj. euro

⁴ Finanšu rādītāju plāni un to izpilde <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un aktuālā CFLA atlasu informācija pieejama: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>

4. 2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM), Ekonomikas ministrijai (turpmāk – EM) un Veselības ministrijai (turpmāk – VM) nav izdevies pilnībā nodrošināt nepieciešamās darbības, lai līdz gada beigām tiktu apstiprināti plānotie investīciju nosacījumi (MK noteikumi) kopā par 147,9 milj. euro ES finansējumu. Attiecīgi 2018. gadā un 2019. gadā vēl ir jāapstiprina MK noteikumi par 219,9 milj. euro (5 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma). Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par MK noteikumu virzību.

Grafiks Nr.2 “2017. – 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 2017. gada 19. decembrim, milj. euro)”

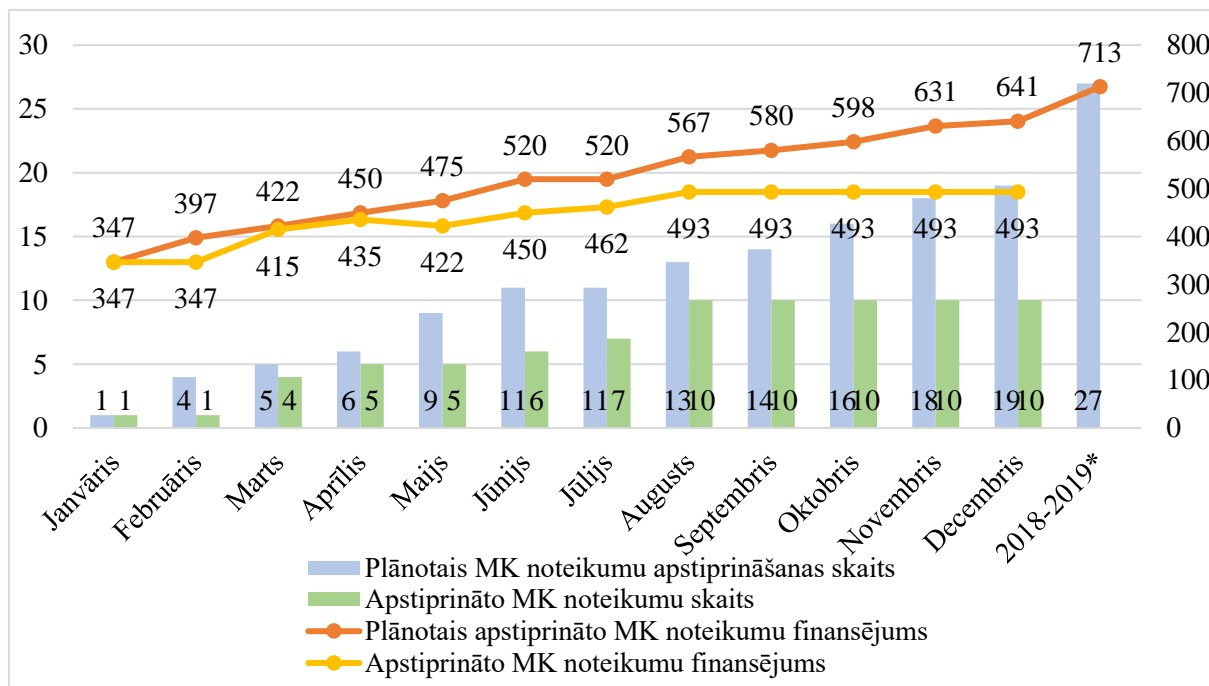

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu.

5. Lai izpildītu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteikto⁵ deleģējumu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanas nosacījumu izstrādāšanai, IZM 2017. gada 14. decembrī Valsts kancelejā iesniedza vairākus SAM īstenošanas noteikumus⁶.

6. IZM 2018. gada sākumā izglītības jomā plāno pabeigt atlikušo (kavēto) MK noteikumu saskaņošanas procesu digitālo, metodisko līdzekļu izstrādei (3,6 milj. euro), kā arī inovāciju grantiem studentiem (28,9 milj. euro). Investīciju noteikumu apstiprināšana 2018. gada sākumā plānota arī EM atbildībā esošajiem MK noteikumiem par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās

⁵ Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka līdz 2017. gada 31. decembrim jābūt pieņemtiem – apstiprinātiem MK noteikumiem par plānotajām ES fondu investīcijām, t.i. vismaz par daļu no pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu).

⁶ 2017. gada 14. decembrī Valsts kancelejā iesniegti MK noteikumi par 8.2.1. SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” īstenošanu.


un valsts ēkās (36,2 milj. *euro*), kā arī VM atbildībā esošajiem MK noteikumiem par veselības aprūpes infrastruktūru trešajai kārtai (13,5 milj. *euro*).

7. FM apkopos atbildīgo iestāžu informāciju par atlikušo investīciju nosacījumu izstrādes un virzības aktualizētiem plāniem. Kopējo plānu FM līdz 2018. gada 1. martam iesniegs valdībā apstiprināšanai kopā ar kārtējo pusgada informatīvo ziņojumu.

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums

8. Projektu dati un prognozes izpildei 2017. gada decembrī⁷ liecina, ka kopējais ES fondu maksājumu apjoms 2017. gadā varētu sasniegt 352 milj. *euro*, kas ir 80% no gada plāna (par 20 %, jeb 84 milj. *euro* mazāk nekā plānots 435,6 milj. *euro*). Līdz 2017. gada 1. decembrim no pārskata perioda kumulatīvā plāna 352 milj. *euro* ir izpildīti 78,5 % jeb 278 milj. *euro*. Konstatējams, ka mazāka izpilde ir gan dēļ ceļu rekonstrukcijas projektu izmaksu efektīvākiem risinājumiem (ietaupījumi), gan dažādiem investīciju kavējumu skaidrojumiem. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē⁸.

Grafiks Nr.3 "2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. *euro*."

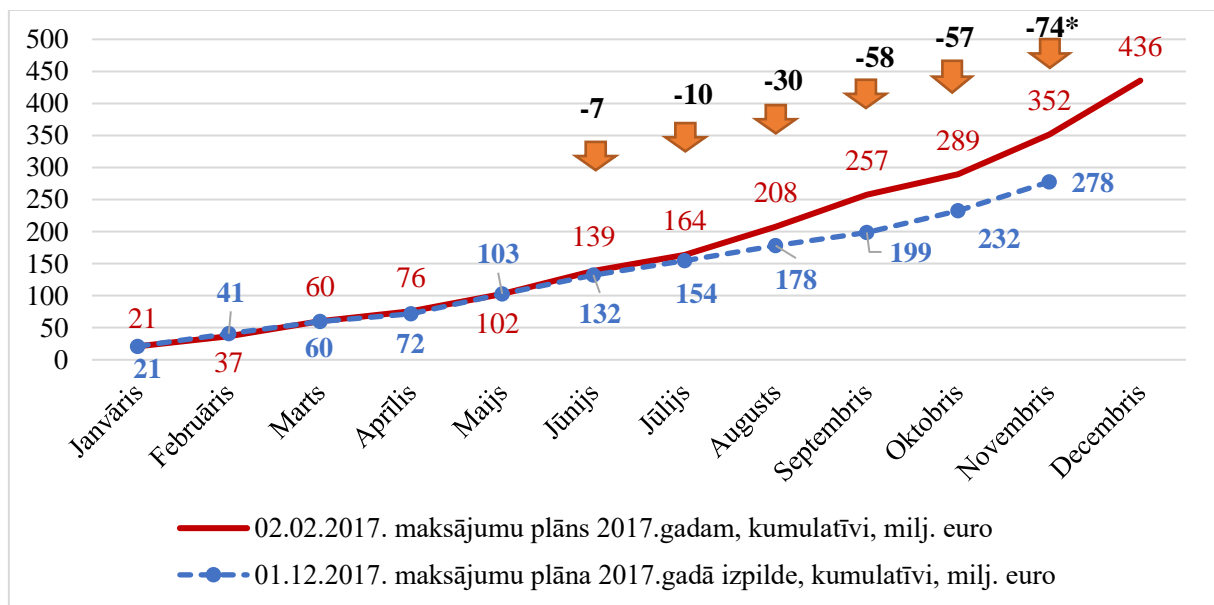

* pārskata perioda neizpilde.

9. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē kopumā saglabājas investīciju jomās, kas minētas iepriekšējos pārskata periodos: (1) 19,1 milj. *euro* transporta jomā (svarīgi ņemt vērā, ka mazāka maksājumu plūsma lielākoties

⁷ Precīzi izpildes dati būs pieejami 2018. gada janvārī.

⁸ Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016. gada II pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>. Papildus skatīt skaidrojumu un rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam, 30. jūnijam, 31. jūlijam, 31. augustam, 30. septembrim un 31. oktobrim. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

pozitīvu ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu rekonstrukcijā); (2) 10,7 milj. *euro* izglītības jomā; (3) 10 milj. *euro* sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā (4) 8,7 milj. *euro* nodarbinātības jomā; (5) 6,6 milj. *euro* IKT jomā.

10. FM sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un atbildīgajām iestādēm ikdienā veic darbības, lai pēc iespējas palīdzētu projektu īstenotājiem sekmīgi uzsākt un īstenot projektus – notiek semināri, konsultācijas gan individuāli, gan plašākai mērķa grupai. Tāpat svarīgi, ka individuālu projektu ieviešanas plānu kavējumu vai citu sarežģījumu gadījumā, CFLA aktualizē jautājumus tieši ar projektu īstenotājiem. Savstarpējās operatīvās sadarbības rezultātā pārsvarā tiek rasti risinājumi investīciju plūsmas intensificēšanai un risku mazināšanai. Projektu īstenotāji tiek aicināti proaktīvi konsultēties ar CFLA.

Ierobežotas projektu iesniegumu atlasēs (turpmāk – IPIA)⁹ projektu īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums

11. Līdz 2017. gada 1. decembrim IPIA individuālo projektu maksājumu pieprasījumu plānu kopējā izpildē ir ievērojams uzlabojums, jo samazinās kopējie kavējumi (neizpilde uz 2017. gada 1. decembri ir 27 milj. *euro*, salīdzinot ar 41 milj. *euro* iepriekšējā mēnesī¹⁰). FM konstatē pozitīvu tendenci investīciju veikšanā un naudas plūsmā. Tāpat ir daudzi sekmīgi projekti, kas izpilda vai pārsniedz plānoto. Tādēļ kopēju sniegumu pozitīvi ietekmēja 198 projekti (lielākais īpatsvars pašvaldību projektiem), kur veiktās investīcijas bija lielākos apmēros nekā plānots (par 67,7 milj. *euro* vairāk).


12. Vienlaikus individuālu projektu līmenī negatīva tendence saglabājas – 2017. gada plāns līdz 1. decembrim nav izpildīts 214 projektos par 108,5 milj. *euro*, no kuriem 86 projekti jeb 97 % (105,0 milj. *euro*) ir ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. *euro*. Līdz 2017. gada decembrim projektu īstenotāji CFLA ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos 2017. gadam, samazinot kopumā gada plānu par 90,9 milj. *euro*.

13. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. Ziņojuma 2. pielikuma 1. tabulā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi un izmainītie plāni 2017. gadam.

⁹ IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. *euro*). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlasu projektos”: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

¹⁰ Novembris ir pirmais mēnesis 2017. gadā, kad maksājumu pieprasījumu summa pārsniedz plānoto par 13,7 milj. *euro* un samazina kumulatīvo plānu neizpildes.

Grafiks Nr.4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro.”

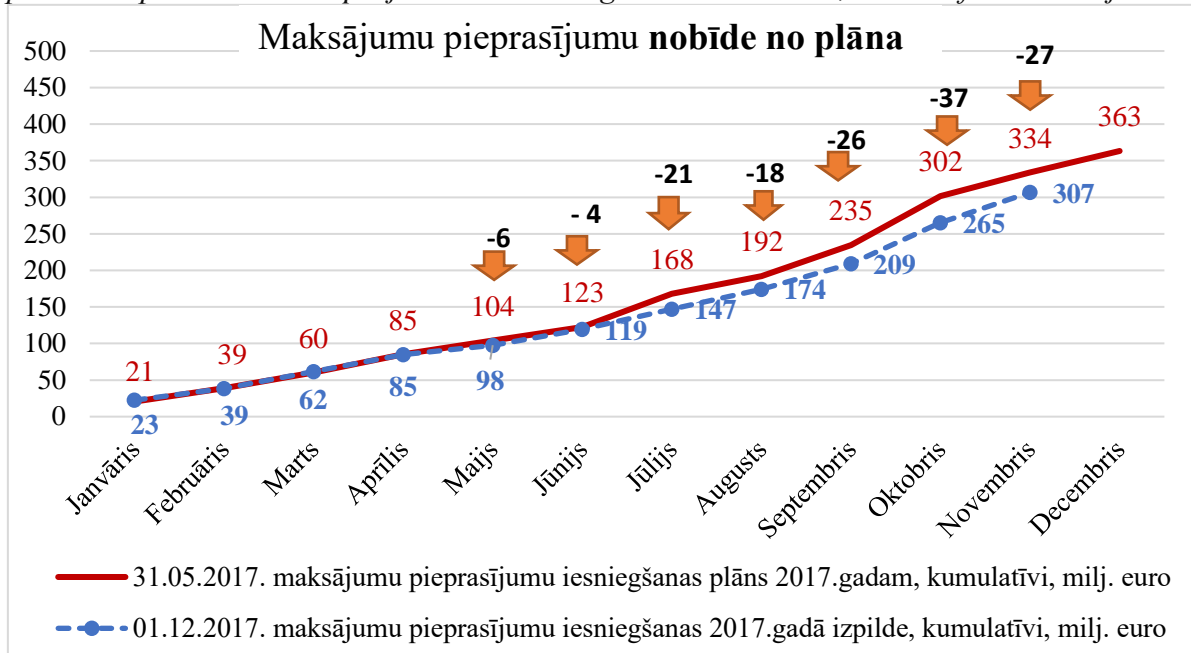


14. 149 projektiem maksājumu pieprasījumi kavēti par vairāk kā 25 % no kumulatīvi 11 mēnešos plānotā, kas sasniedz 96,4 milj. euro (no tā 80 % ir neizpilde virs 50 %). Vienlaikus, analizējot, būtu jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos ir objektīvs pamatojums novirzēm no sākotnēji plānotās investīciju naudas plūsmas, piemēram, kad iepirkuma līgumu izdevies noslēgt par mazāku summu nekā sākotnēji plānots (šādas situācijas līdz šim ir, galvenokārt, ceļu rekonstrukcijas projektos). Attiecīgi šādi būtu izņēmuma gadījumi, kas nebūtu uzskatāmi par kavējumiem. 2018. gadā finanšu plānu negatīvām novirzēm virs 25% tiks pievērsta nopietnāka uzmanība, t.sk. lemjot par nepieciešamiem finanšu disciplīnas pasākumiem. Ziņojuma 2. pielikuma 2. tabulā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir kavējumi virs 25%.

IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā

15. Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 15. decembrim. Kopā atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 65 projekti par 108,5 milj. euro ES fondu finansējuma). Vienlaikus ir pozitīva tendence, jo neiesniegto projektu apjoms salīdzinoši ievērojami samazinās.

Grafiks Nr.5 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”

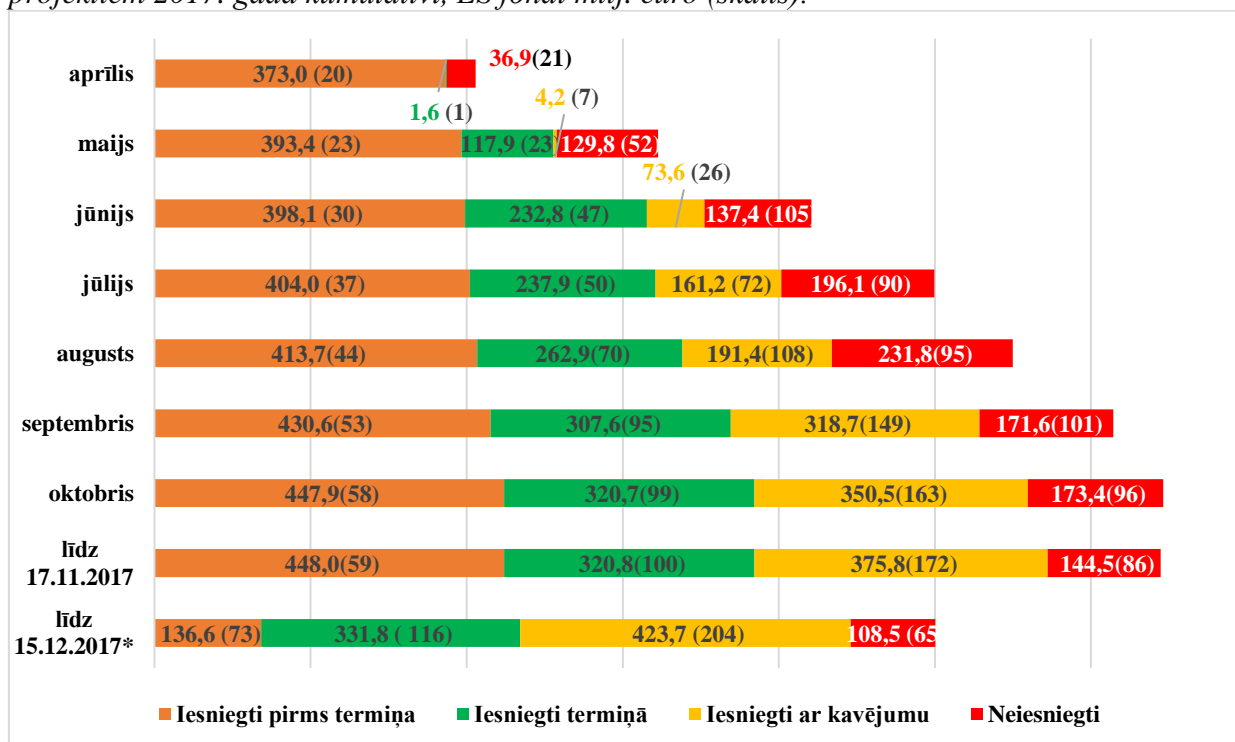

*Atsaukts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts”, no jauna iesniedzams līdz 2018. gada 28. februārim.

16. Lielākie iesniegumu kavējumi saistās ar projektiem, kuriem noslēgusies iesniegumu atlase – energoefektivitātes, uzņēmējdarbības un ūdenssaimniecības jomās (kopā 39,4 milj. euro), un integrēti teritoriālo investīciju projektiem (kopā 33,7 milj. euro), kuriem pašvaldības lūdz pagarināt iesniegšanas termiņus, kā būtisko kavēšanās iemeslu minot projektētāju noslodzi.

17. CFLA un atbildīgās iestādes aktīvi komunicē ar projektu īstenotājiem par projektu iesniegšanas laika grafikiem un ieviešanas plāniem, konsultējot par iespējām paātrināt procesus, aicinot stiprināt projektu vadības un ieviešanas kapacitāti, t.sk. piesaistot cilvēkresursus ārpakalpojumā, ja nepieciešams. 2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī atsevišķi projektu īstenotāji sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm pārskata plānus un risku pārvaldības pasākumus. Attiecīgi ieviešanas grafiki un naudas plūsmu plāni vēl var tikt aktualizēti. Precīzāka 2018. gada plānu informācija tiks iekļauta 2018. gada janvāra ziņojumā.

Citi aktuālie jautājumi

18. IZM Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma (2017)¹¹ saskaņošanas process turpinās. Sasniegtais progress tika pārrunāts arī ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) ietvaros¹² 2017. gada 30. novembrī.

19. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” virzība¹³ notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcības plānam (balstoties uz ikmēneša atskaitēm Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) un FM). Rīgas dome 2017. gada 15. decembrī apstiprinājusi Eksportostas un Krievu salas lokālplānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Stividoru darbības nodrošināšanai Krievu salā tiek veikta kravu laukumu izbūve, kā arī putekļu žoga un atsevišķas infrastruktūras projektēšana.

20. SM uzsākusi grozījumu sagatavošanu MK noteikumos par iespēju izmantot publiskā finansējuma snieguma rezervi 15 899 728 *euro* 6.1.5. SAM “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros un 16 897 660 *euro* 6.3.1. SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros pirms EK lēmuma par snieguma ietvara mērķu izpildi atbilstoši Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem darba grupas 24. oktobra sēdē lemtajam. Grozījumus SM plāno iesniegt MK līdz 2018. gada 31. janvārim.

21. 2017. gada 13. novembrī saņemta EK vēstule, ar kuru EK lūdz nodrošināt, ka nevienā tematiskā mērķa jomā sabiedriskajām ēkām paredzētās ES fondu investīcijas netiek piešķirtas ilgtermiņa aprūpes iestādēm, piemēram, specializētām iestādēm personām ar invaliditāti, garīgās veselības problēmām un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem. Vienlaikus Latvija kā dalībvalsts tiek aicināta virzīt investīcijas uz sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. Labklājības ministrija un FM ir uzsākusi oficiālu nostājas skaidrošanās procesu ar EK, lai paustu Latvijas pozīciju un nodrošinātu visām pusēm viennozīmīgi skaidru izpratni par EK interpretāciju attiecībā uz investīcijām ilgtermiņa aprūpes iestādēs, t.sk. attiecībā uz tādiem būtiskiem aspektiem kā tiesiskā palāvēība un jau veiktajiem izdevumiem.

¹¹ Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 8. jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017. gada 15. jūnija sēdē. MK uzdevums, izskatot IZM ziņojumu “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Tajā ietvertais analītisko ziņojuma sagatavošanas laika grafiks paredzēja RIS3 apsekojuma iesniegšanu Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskajā padomē līdz 2017. gada 1. jūnijam; pārējie progressa ziņojumi iesniedzami 2019., 2021. un 2023. gadā (uz 01.06.) (izskatīts MK 2015. gada 15. septembrī; sēdes protokols Nr. 47 35.§). IZM 2017. gada 6. novembrī saskaņošanai iesniegusi precizēto ziņojumu (FM atzinums ar iebildumiem sniegts 2017. gada 13. novembrī).

¹² sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017 → 02_Working_materials → 02_30.11.2017 → 3.1_MoES_Smart_specialisation: <https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx>

¹³ Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros.

22. Sadarbības partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem sanāksmē uzdoto uzdevumu izpildes statuss¹⁴:

1) 2017. gada 30. novembrī EK apstiprinājusi grozījumus Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumus Nr. 2.

2) 2017. gada decembrī tiks uzsākta darbības programmas grozījumu priekšlikuma Nr. 3 saskaņošanu ES fondu Uzraudzības komitejā, lai tos apstiprinātu MK un iesniegtu EK. Grozījumu priekšlikums īpaši svarīgs attiecībā uz veselības un sociālās iekļaušanas jomas (9. prioritārais virziens) snieguma ietvara mērķa 2018. gadam samazināšanu, lai saglabātu iespēju saņemt 6 % snieguma rezerves finansējumu nozaru investīcijām. Tāpat tiek rosināti citi nozīmīgi precizējumi (datu aktualizācija un noteikto rādītāju snieguma samazinājumi/precizējumi) nolūkā veikt investīcijas pēc iespējas efektīvi.

3) Attiecībā uz lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”¹⁵ 2017. gada 5. decembrī MK izskatīts SM informatīvais ziņojums par projekta sagatavošanas progresu un īstenošanas risinājumiem, kas nerada ietekmi uz vispārējās valdības budžetu. Atbilstoši MK lēmumam pagarināts projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA termiņš līdz 2018. gada 28. februārim. VAS “Latvijas dzelzceļš” ir uzsākusi konsultācijas ar JASPERS par aktualizēto projekta iesniegumu un pamatojošo dokumentāciju, vienlaikus informējot un iesaistot EK (DG REGIO) pārstāvjus ātrākam rezultātam. Tāpat SM un VAS “Latvijas dzelzceļš” informēja EK (DG REGIO) par statusu un plānoto rīcību, izskatot jautājumu ikgadējās tikšanās laikā 2017. gada 30. novembrī. Projektu plānots iesniegt EK 2018. gada maijā.

4) 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” investīciju projektu īstenošanā joprojām nav būtiska progressa¹⁶. EM virza izmaiņas saistošos MK noteikumos par pirmās kārtas investīcijām, kas ir saskaņošanas stadijā. Noteikumus otrās kārtas īstenošanai plānots izskatīt MK 2018. gada 4. janvārī¹⁷.

¹⁴ Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti.

¹⁵ Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam.

¹⁶ Līdz 2017. gada 13. decembrim CFLA iesniegti 35 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 17,3 milj. euro un iekļauto ēku kopējā platība ir 175 608 m²).

¹⁷ Atbilstoši MK 2017. gada 19. decembra sēdes protokola Nr. 63 62.§ “Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. SAM “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

Turpmākā prioritārā rīcība:

Turpināms neatlaidīgs fokuss uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus.

Pastiprināts un proaktīvs CFLA atbalsts, konsultācijas projektu īstenotājiem.

2017. gada pēdējā mēnesī FM sadarbībā ar CFLA un atbildīgajām iestādēm turpinās intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un prognožu izstrādes.

Aktīva Latvijas interešu argumentēšana EK, virzot nepieciešamās izmaiņas Darbības programmā.

Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Valaine 67083925

Ilze.Valaine@fm.gov.lv
